

ZŠ Glowackého 555/6, Praha 8 - Troja
„Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách,,

Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo „Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách“
uzavřená podle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku
(zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	S com ENERGO s.r.o.
se sídlem:	Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupený:	Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti
IČ:	24761923
DIČ:	CZ24761923
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., Praha 4
číslo účtu:	5041103949/5500

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:	Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
se sídlem:	Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja
zastoupené:	Mgr. Miroslavem Korandou, ředitelem
IČ:	60433302
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	2597875/0300

(dále jen objednatel)

uzavírají dle ust. §536 a násl. cit. Obchodního zákoníku s přihlédnutím k ust. § 43 a násl. Občanského zákoníku (Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách“

Čl. I.
Popis

1. Vzhledem k technickému stavu skrytých komponentů, které nemohl ani objednatel, ani zhotovitel předpokládat (viz. Příloha č.1, Příloha č.2 a Příloha č.3) dochází ke změně Čl.III původní Smlouvy o dílo.

**Čl.II.
Doba plnění**

1. V souvislosti s Čl.I této smlouvy se obě strany po oboustranném odsouhlasení shodly na změně termínu předání realizace dle předloženého harmonogramu (Příloha č.3) do **21.1.2014**.

**Čl.III.
Cena díla**

1. **Veškeré vícepráce a materiály** vyplývající z tohoto Dodatku č.1 **hradí zhotovitel**.

**Čl.IV
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Příloha č.1: Zdůvodnění prodloužení termínu

Příloha č.2: Fotodokumentace poškozených technologických prvků

Příloha č.3: Schéma nového elektroinstalačního propojení


Příloha č.4: Harmonogram dokončení stavby

V Praze dne : 6.1.2014

Za zhotovitele :



Jaroslav Vasilev
S com ENERGO s.r.o.

 **S com ENERGO s.r.o.**
ENERGO
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

V Praze dne : 6.1.14

Za objednatele :



Mgr. Miroslav Koranda
ředitel
Základní škola ④
Praha 8, Glowackého 6
Glowackého 6/555
181 00 PRAHA 8
tel./fax: 233 321 972, IČO: 60433302



S com ENERGO s.r.o.
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

Tel: +420 257 090 311
Fax: +420 257 090 399
e-mail: zdenek.novak@scom.cz
http://www.scom.cz

Vaše značka

Ze dne

Naše značka
131116

Vyřizuje
Zdeněk Novák

Telefon
+420 739 919 587

Praha
23.12.2013

Věc: Zdůvodnění změny termínu realizace : „Výměna osvětlení a podhledů“

v tělocvičnách ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8

Vážený pane řediteli,

vzhledem k technickým záležitostem, které byly skryté a nebylo je možné před zahájením a rozкрыtím stavby předpokládat ani odhadnout, Vám bohužel musím sdělit, že v konsekvenci na tuto problematiku nejsme schopni stavbu předat k užívání v deklarovaném termínu.

U potrubních rozvodů vzduchotechnického zařízení měla být provedena pouze výměna stávajících povrchových výustků. Po odebrání stávajících FEALových podhledů jsme zjistili, že pružná vertikální napojení mají zteřelé a potřhané gumové dilatační pásy (viz. Příloha 1 – fotografie zteřelé dilatace) a díky tomu nezajišťuje vzduchotechnická jednotka požadovanou výměnu vzduchu a ani není možné napojení nových mřížek VZT.

Jelikož realizace vyšla do období svátků a vzduchotechnické společnosti mají inventury, nebo celozávodní dovolenou, podařilo se nám sehnat nejbližší možný termín dodání těchto komponentů na 6.1.2014. Do této doby nemůžeme z důvodu zajištění nutného přístupu pro montáž nových napojení zahájit zakrývací práce akustickými sádrokartony.

Dále jsme zjistili, že propojení mezi jednotlivými světelnými sekcemi je v provedení Al, což neodpovídá normě a kabeláž musí být předělána do provedení Cu (viz. Příloha č.2 – schéma nových propojení).


V návaznosti na tyto záležitosti Vám na základě oboustranného odsouhlasení a dohody předkládáme konečný a závazný harmonogram dokončení této realizace (Příloha č.3 – HMG stavby).

Tímto se Vám omlouváme za provozní komplikace, které nevznikly naším zaviněním, ale jsme si vědomi, že Vám přinášejí problémy a výrazně ovlivňují chod celé vaší instituce.


S úctou


Zdeněk Novák


S com ENERGO s.r.o.

 S com ENERGO s.r.o.
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923




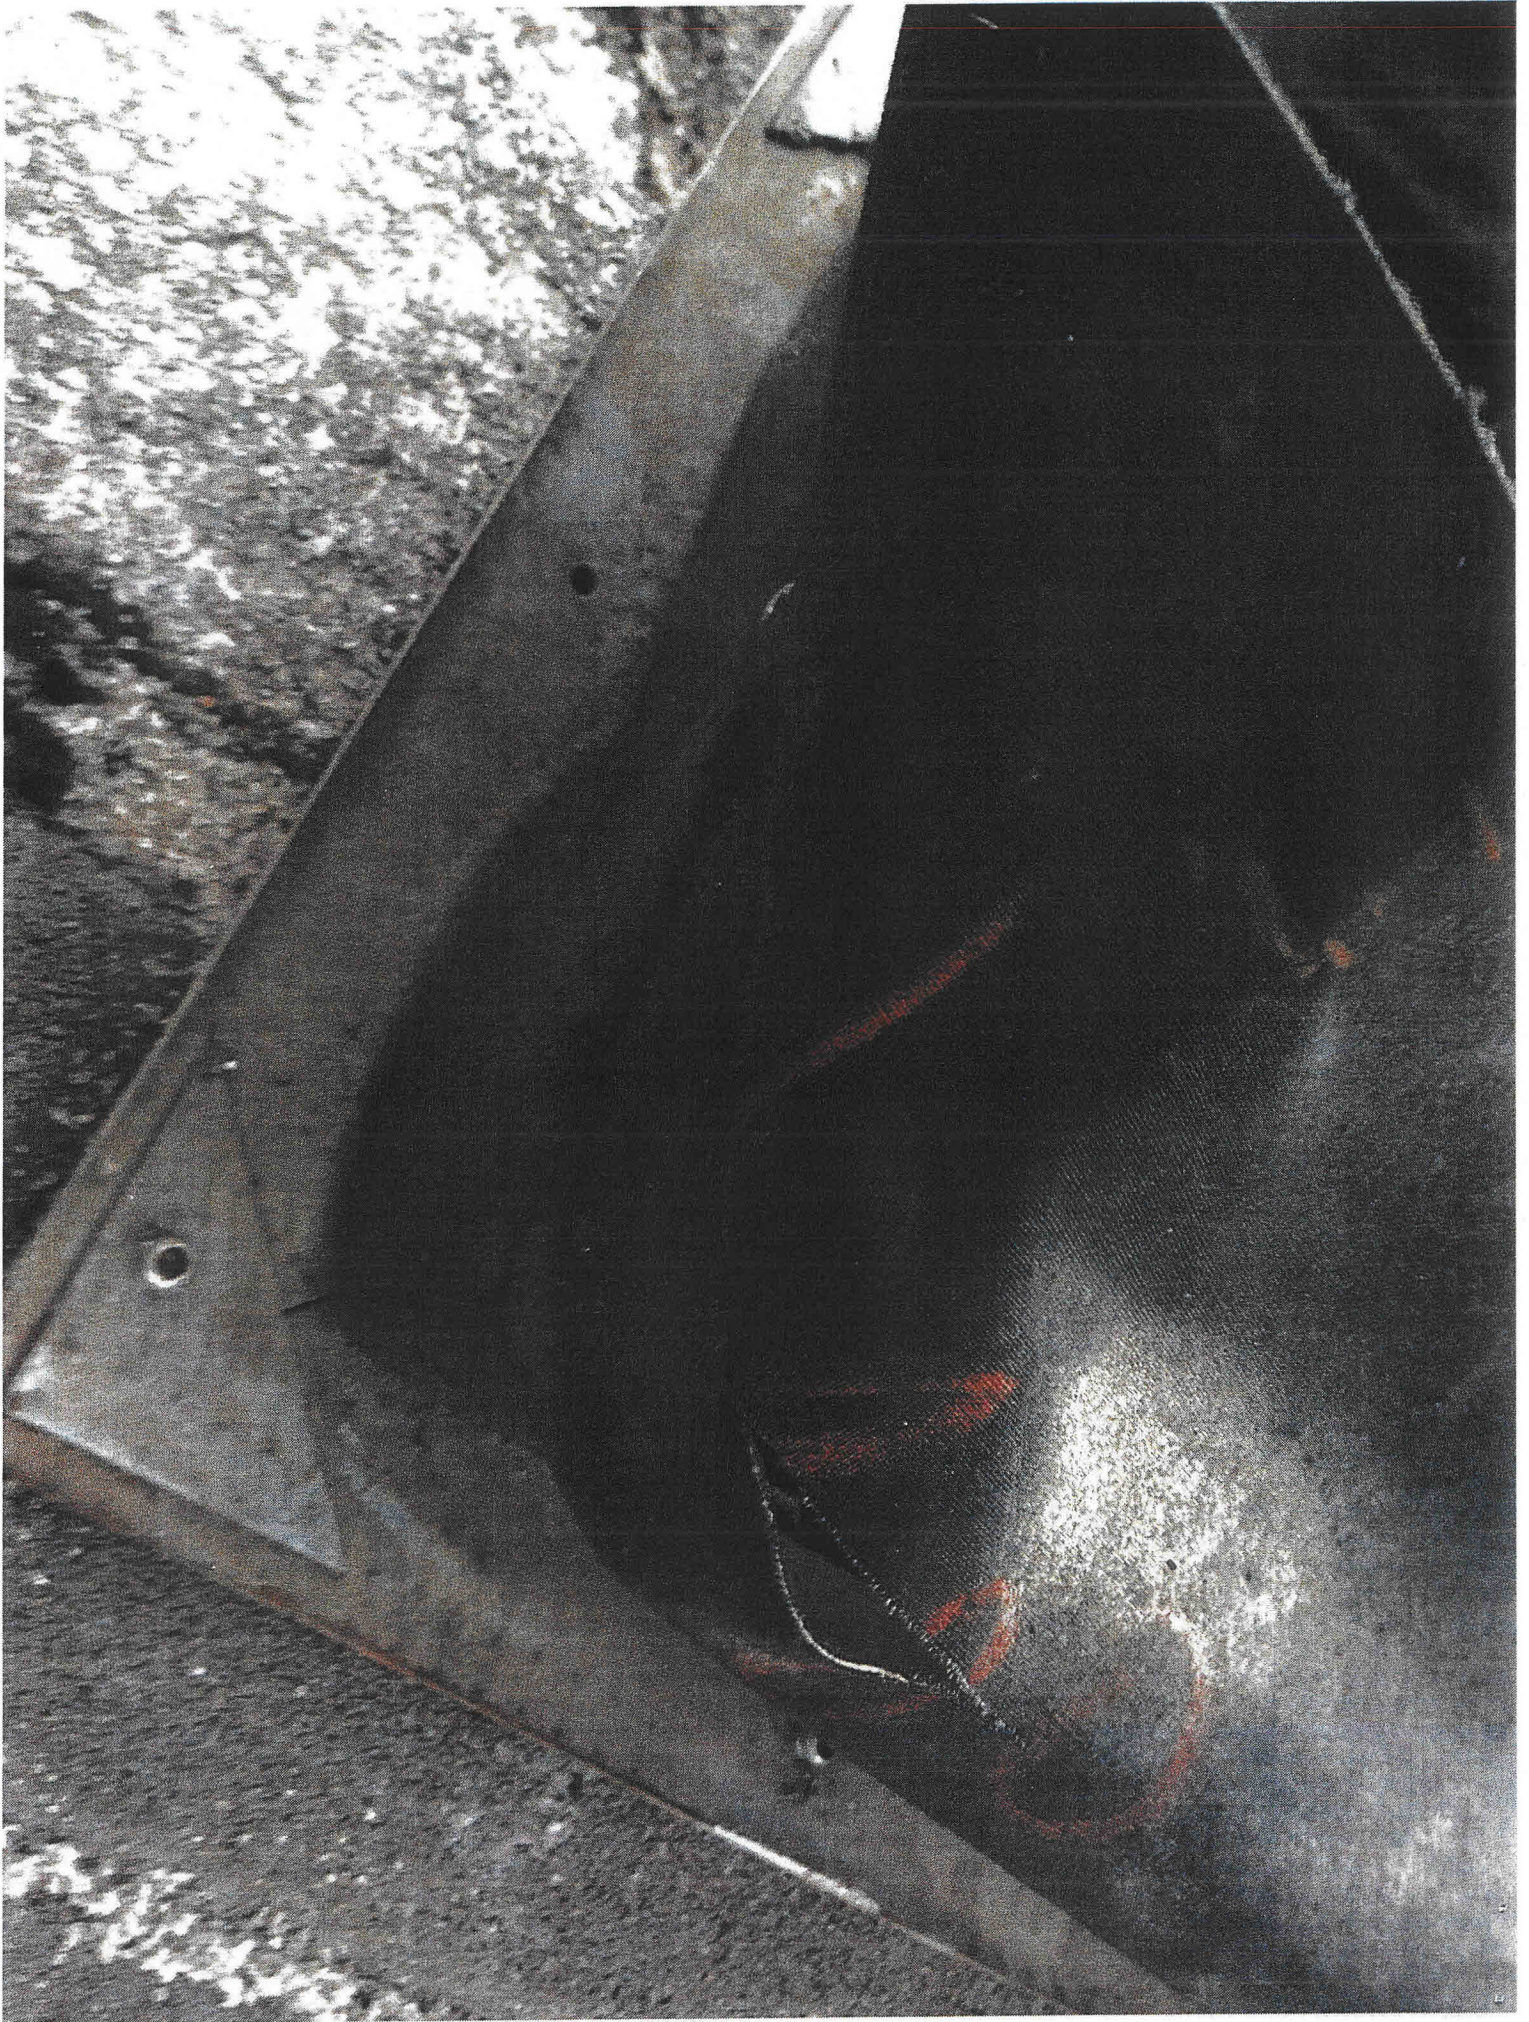

ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8 - elektroinstalace - velká tělocvična

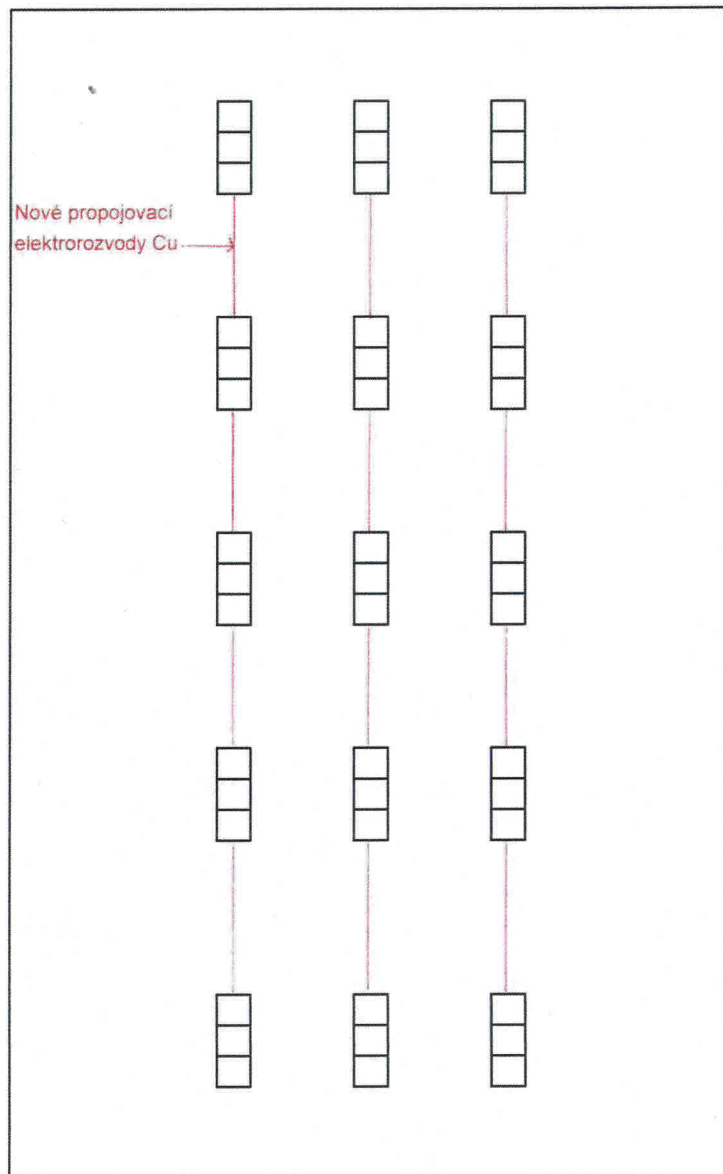

ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8 - elektroinstalace - malá tělocvična

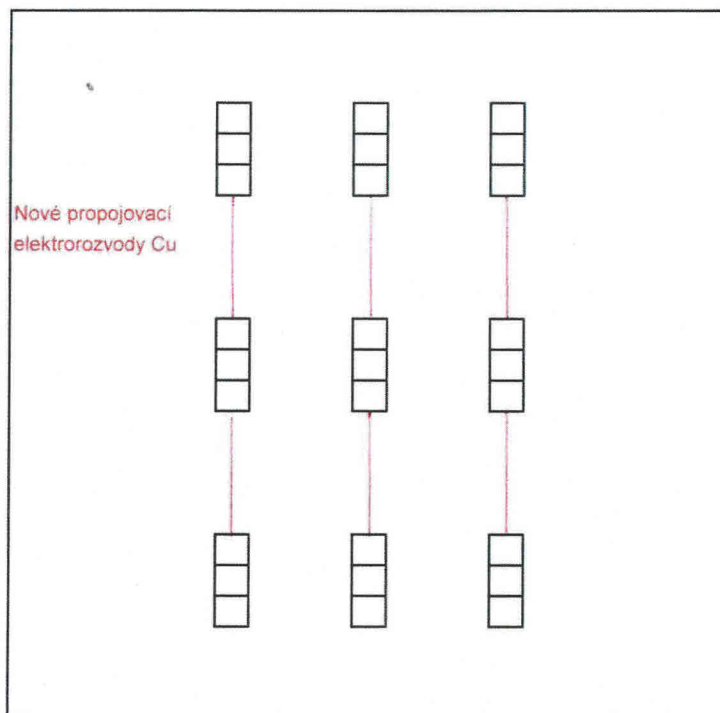



23.12.2013
ZŠ Glowackého

Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách - ZŠ Glowackého

název činnosti	Po 6.1	Út 7.1	St 8.1	Ct 9.1	Pá 10.1	So 11.1	Ne 12.1	Po 13.1	Út 14.1	St 15.1	ČT 16.1	Pá 17.1	So 18.1	Ne 19.1	Po 20.1	Út 21.1
1 Dodání výustků VZT	■															
2 Montáž výustků VZT		■														
3 Zakrývání SDK mTV			■	■	■	■	■	■								
4 Montáž izolace vTV		■	■													
5 Zakrývání SDK vTV			■	■	■	■	■	■	■	■						
6 Malířské práce									■	■	■					
7 Osazování a zapojení svítidel obě TV												■	■	■		
8 Osazení výustků VZT														■		
9 Úklidové práce															■	■
10 Předání staveniště																■
11																
12																
13																
14																
15																
16																

[Handwritten signature]
 S com ENERGO s.r.o.
 Zemské právo 296/14
 102 00 Praha 10 - Hostivař
 IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823
